

「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、1月から3月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

作業概要

【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜日は原則休工


【作業時間】

地上部での作業：原則8時～17時


回転立坑内での作業：終日（夜間作業あり）

作業箇所


【工事箇所】

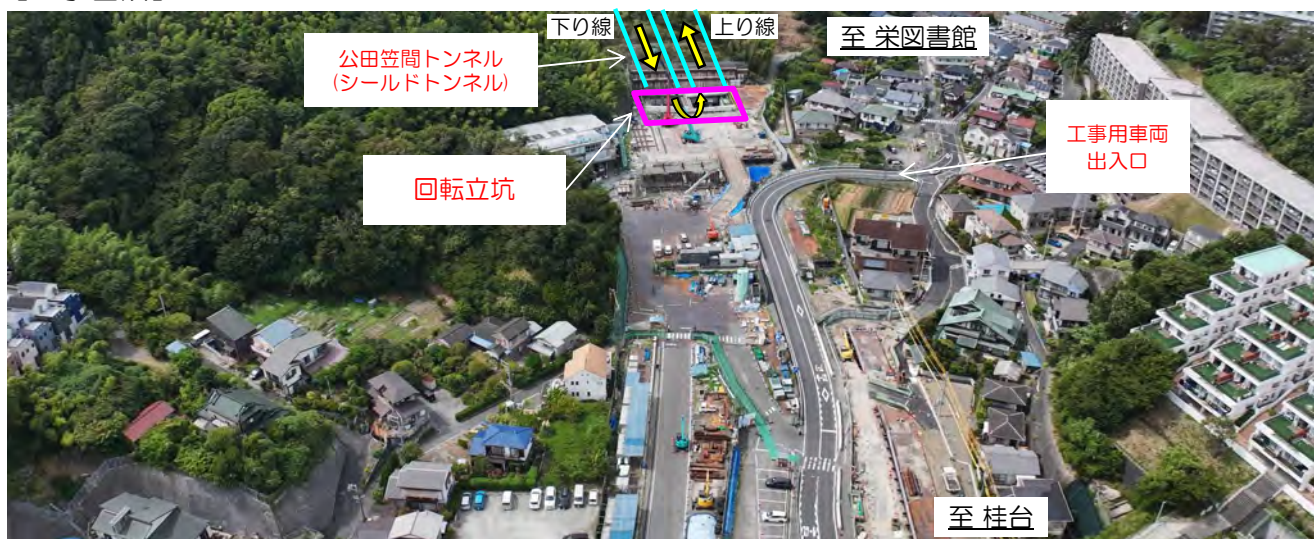

令和7年9月撮影

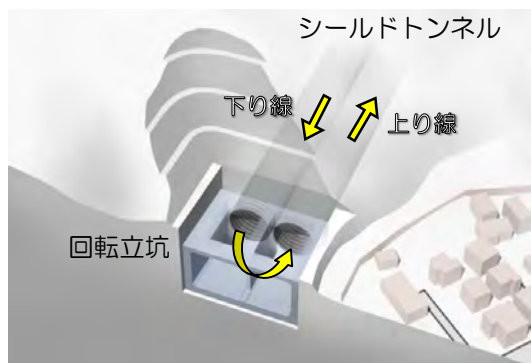


回転立坑イメージ

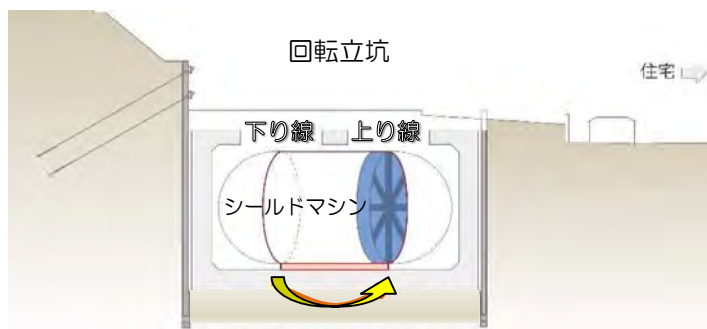

シールド機回転イメージ

作業箇所詳細図

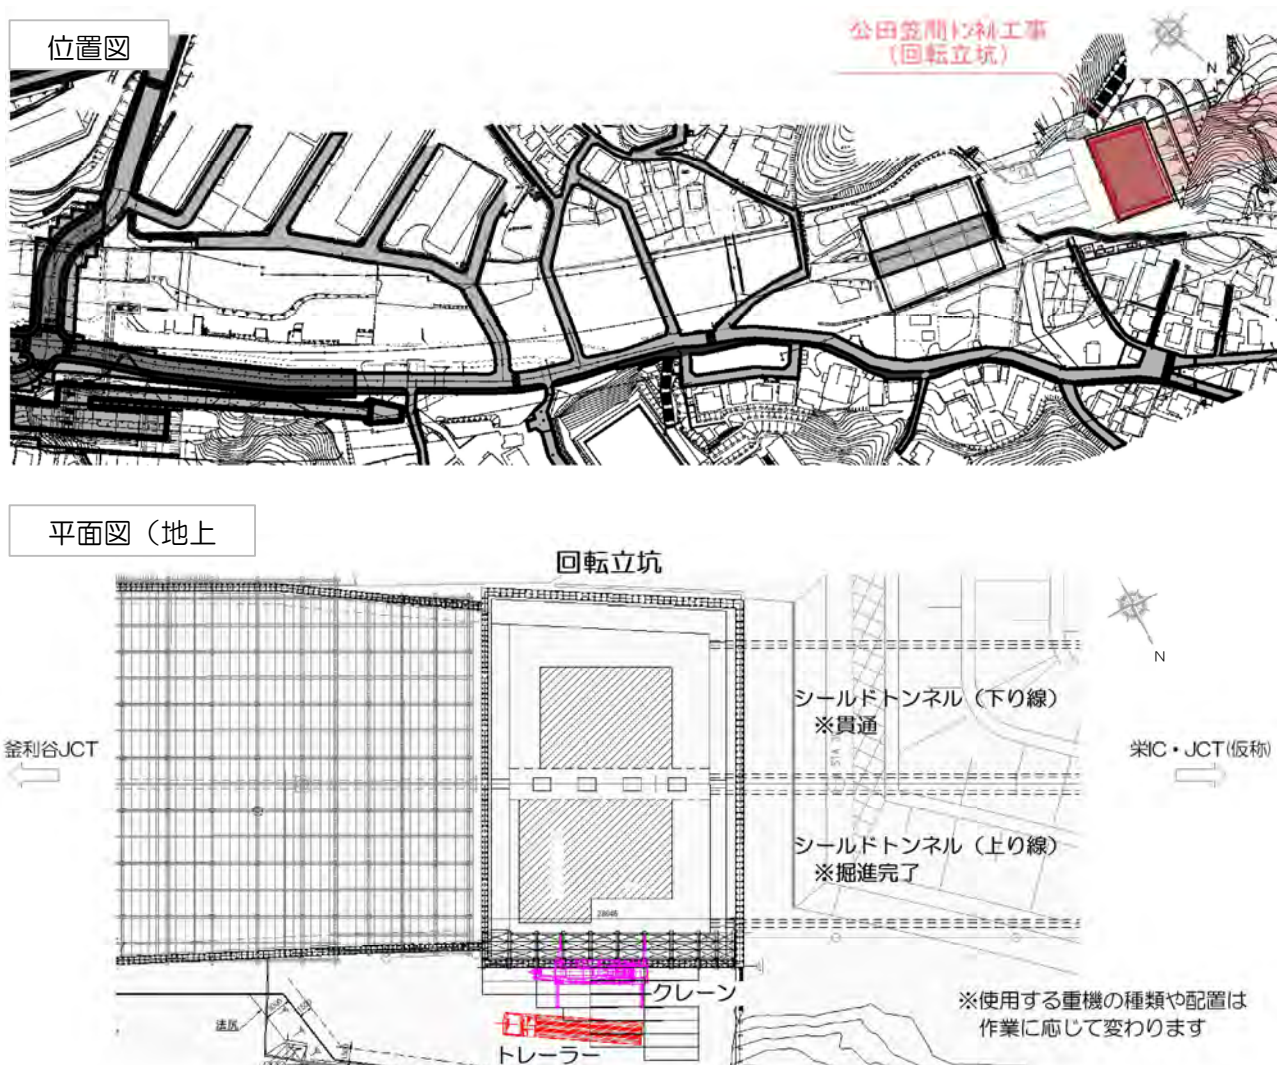

作業工程表と主な作業内容

作業内容	この先 3ヶ月の作業予定								
	1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①シールド設備解体工	年末年始休	設備解体搬出 (1月上旬～回転立坑から搬出)							
②坑内内部構築工		内部構築 (1月上旬～回転立坑から搬出)							

①シールド設備解体工	シールド掘進に使用したトンネル内の設備 (後続台車、ベルトコンベアなど) を解体し、解体した部材を回転立坑から搬出します。
②坑内内部構築工	トンネル内のコンクリート構造物 (避難口合流部、貯水槽など) を構築します。 流動化処理土でトンネル内の路体部分の埋戻しを行います。

- ・2026年1月上旬から回転立坑地上部での作業、工事用車両の搬入を再開します。
- ・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。
- ・トンネル内および立坑内は開閉式防音屋根を閉鎖した上で夜間作業を行います。
- ・年末年始休暇は12/27 (土) ～1/4 (日) の予定です。

工事進捗状況

【回転立坑】



全景写真（R7.11撮影）



回転立坑内の状況（R7.11撮影）

【シールド掘進進捗状況】

令和7年11月25日現在

回転立坑から1,724m



【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所

岩瀬笠間工事区 工事長 伊藤 潔（公田笠間トンネル工事 担当）

TEL：045-439-0180(代)

（平日9時～17時30分）

施工者：公田笠間トンネル工事

鹿島・竹中土木・佐藤工業JV

現場代理人 新川 健二

TEL：045-443-9843（24時間）
