

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、令和6年8月から10月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

作業概要

【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜日・日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時


※シールド掘進及びバルコン土砂搬出は22時まで実施します

作業箇所




工事用道路

地理院地図（国土地理院）(<https://maps.gsi.go.jp/>) をもとに、東日本高速道路株が加工

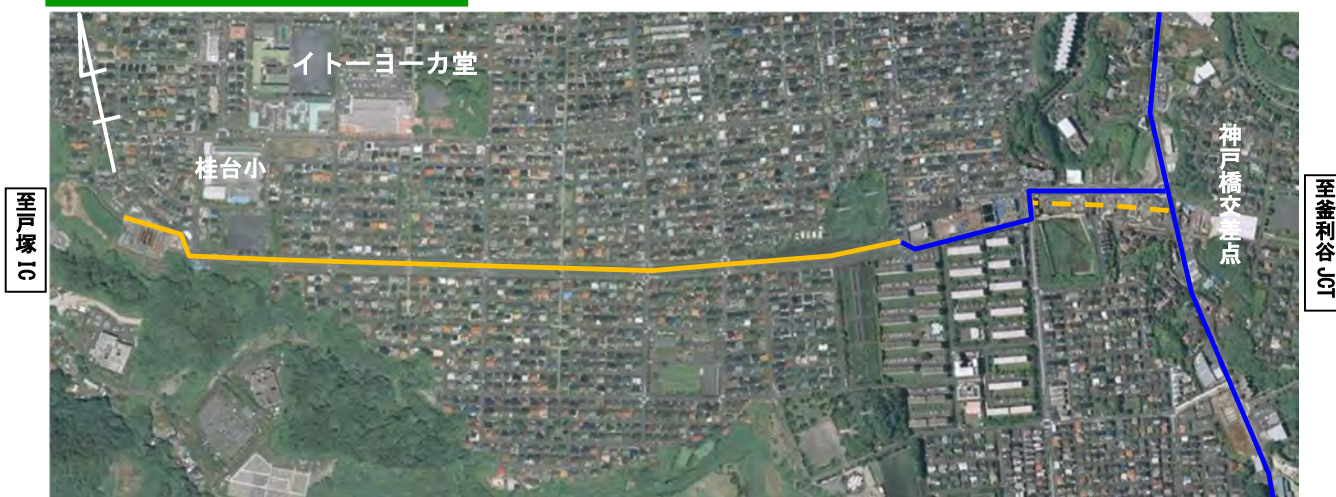


地理院地図（国土地理院）(<https://maps.gsi.go.jp/>) をもとに、東日本高速道路株が加工

(橋梁部)

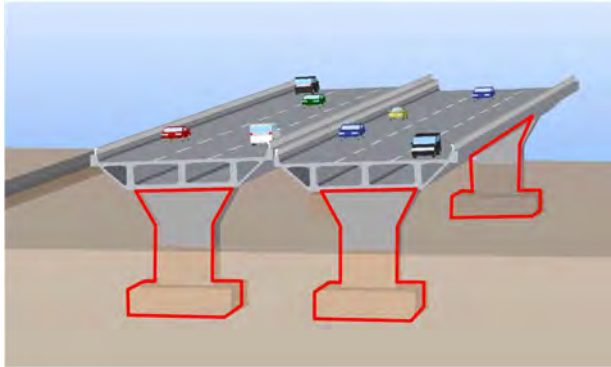


(土工部)

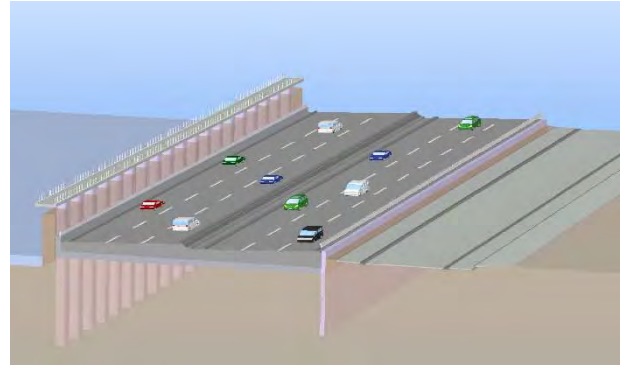


(函渠部)



(立坑部)

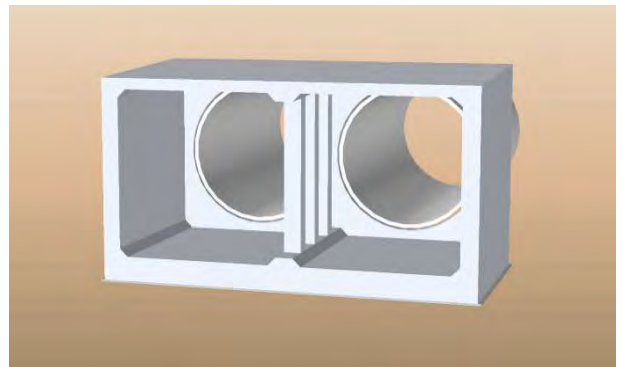


(シールドトンネル部)

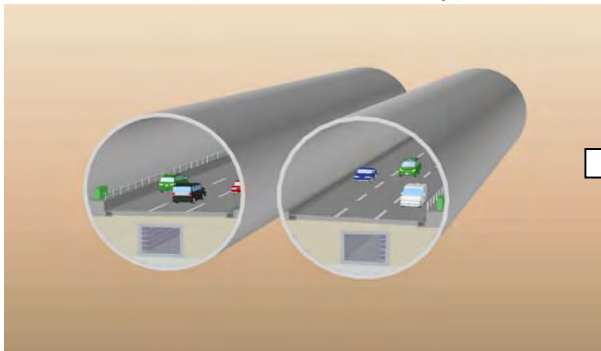

仮設物状況写真

防音ハウス設置状況

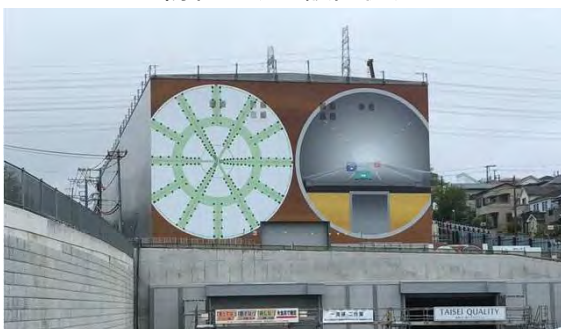

ベルトコンベア設置状況



作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

作業箇所	主な作業内容	この先3カ月の作業予定		
		8月	9月	10月
発進立坑工区	① シールド掘進工	夏 季 休 暇		
釜利谷工区	② 土砂積込・搬出			
回転立坑工区	③ 掘削・土留工			

- ① シールド掘進工：下り線の掘進・トンネル構築を行います。
 - ② 土砂積込・搬出：仮置きしたトンネル掘削土砂の積込及び搬出を行います。
 - ③ 掘削・山留工：換気所建設予定地の土砂掘削・搬出・山留工を行います。
- ※夏季休暇は8/10-8/18の予定です。

工事進捗状況

【シールド掘進工進捗状況】

○令和6年3月より下り線の掘進を行っております

桂台トンネルシールドマシン愛称「モぐるん」の位置

令和6年7月8日現在
回転立坑から696m



上り線の掘進を完了したシールドマシン「モぐるん」は、下り線の掘進を行っています。

【進捗状況写真(6月撮影)】

写真撮影位置図



【連絡先】

発注者 : 東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 河井 誠治 Tel. 045-439-0180 (代表)

施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 山田 紀之 Tel. 045-392-3985
